UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN

E.P. INGENIERÍA DE SISTEMAS

Formulación y evaluación de proyectos informáticos

Gobernanza organizacional y gobernanza de un proyecto

Mg. Omar L. Loaiza Jara
Reg. CIP 94684
olloja@Hotmail.com

Grupo de procesos PMBOK e identificación de interesados

Presentación docente:

Presentación del docente del curso:

Mg. Omar L. Loaiza Jara

Docente investigador del CONCYTEC

Evaluador externo del SINEACE.

6 artículos científicos en Scopus
2 artículos científicos en Web of Science

Formación de grupos:

Registrar con el Docente del curso los grupos de trabajo, consignando:

1. Nombre del grupo de trabajo.
2. Integrantes.
3. Lugar tentativo de trabajo.
4. dsd

Problema	Impacto	Proyecto(s)	Beneficios	Riesgos
Problema1				
Problema2				
Problema3				

Selección de proyecto a trabajar:

Poryecto	Impacto ecoómico					Impacto estratégico (+)					Compromiso de recursos (-)					Rpta. al medio ambiente (+)					Puntaje
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	

Selección de proyecto a trabajar:

1. Detalle la causas y efectos del problema que generan el proyecto
   Ver recurso en el aula virtual – Semana 3
2. Desarrolle la justificación del proyecto:
   ¿Cuáles son los beneficios de desarrollar el proyecto?
   ¿Qué cosas podrán hacerse a partir de la ejecución del proyecto?
3. Relacione su intención de proyecto a uno de los cuatro factores de pueden generar un proyecto. Justifiquen su respuesta redactando un párrafo.

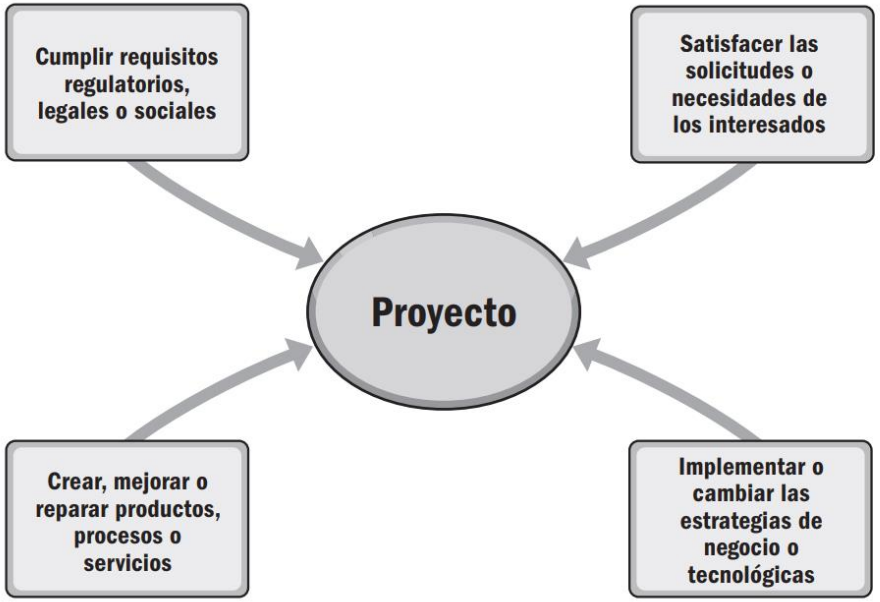

Identificando el problema que origina el proyecto:

No es un problema:

Lo que no hay…

Lo que no existe…

Lo que falta…

Identificando el problema que origina el proyecto:

PROBLEMAS INADECUADAMENTE FORMULADOS

Falta de efectivo para calcular la planilla del personal asignado a procesos de fabricación de chocolate en la fábrica Continental SAC.
No hay venta inventario de medicinas en la clínica Ricardo Palma
No hay venta de servicios a potenciales clientes en Casas hospedaje de la ciudad del Arequipa desde mercados emisores
No hay información disponible del procesamiento de documentos comerciales en fábrica de yogurt Fresquito.
Inexistente cantidad de envíos de paquetes personales a destinos internacionales en ABC Logistc SAC

PROBLEMAS ADECUADAMENTE FORMULADOS

Inexacta contratación de personal asignado a procesos de fabricación de chocolate en la fábrica Continental SAC.

Ineficiente pronóstico de ventas del inventario de medicamentos de la clínica Ricardo Palma
Dificultosa venta de servicios a potenciales clientes de Casas hospedaje de la ciudad del Arequipa desde mercados emisores
Lento procesamiento de documentos comerciales en fábrica de yogurt Fresquito.
Recurrente equivocación en el envío de paquetes personales a destinos internacionales en ABC Logistc SAC

Adjetivo calificativo en negativo + acción + objeto directo + dónde

~~No hay~~
~~No existe~~
~~Falta~~

¡¡¡Lo que no existe no es un problema!!!

Redactando bien el problema que origina el proyecto:

- ***Inadecuado*** control de inventarios en los almacenes de Distribuidora La Esperanza.
- ***Inexacta*** contratación de personal asignado a procesos de fabricación de chocolate en la fábrica Continental SAC.
- ***Dificultad*** en la determinación de niveles óptimos de contratación de personal para fabricación de chocolate en la fábrica Continental SAC.
- ***Lento*** procesamiento de documentos comerciales en fábrica de yogurt Fresquito.

- ***Inadecuada*** asignación de recursos de defensa civil en casos de desastres.
- ***Empirico*** pronóstico de ventas de helados La Gelateria EIRLtda.
- ***Elevada*** tasa de errores en evaluación de créditos de consumo en Banco de Comercio.
- ***Complicada*** evaluación de créditos de consumo en Banco de Comercio.
- ***Limitada*** capacidad de atención de despacho de pedidos de venta al exterior en Artesanías Mendivil SAC.
- ***Limitado*** acceso comercial a potenciales clientes de Uña de gato en los estados de la costa este de los Estados Unidos de Norteamérica.
- ***Alta rotación*** de clientes nuevos en la línea de servicios financieros para micro empresarios de Caja Piura.

Redactando bien el problema que origina el proyecto:

- ***Limitada*** segmentación en la oferta de venta/alquiler de viviendas para clientes particulares en Lima Este para la Inmobiliaria El Progreso SAC.
- ***Deficiente*** construcción de patrones de consumo de ropa depotiva en la empresa deportiva Aries Sport SAC.
- ***Obsoleto*** estado de la red administrativa de Productos Pan de Vida SRLtda.
- ***Burocrática*** y diseminada gestión de documentos de exportación en entidades estatales en el Perú.
- ***Deficiente*** atención de servicios TI a usuarios de la Dirección Central de Sistemas de Kalpa Asesores Internacionales.
- ***Inadecuado*** registro, evaluación y selección de postores en procesos de selección de menor cuantía en la Unidad de Logística del Gobierno Regional de Ucayali.
- ***No garantizada*** protección de accceso de terceros no autorizados a información electrónica transmitida en la red informática de la Municipalidad Provincial de Lima Metropolitana.
- ***Complicado*** de manejo de herramientas y procedimientos en la construcción de aplicaciones web en el modelo Modelo-Vista-Presentador.
- ***Limitado*** registro, supervisión y evaluación de prácticas pre profesionales de los estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad San Luis Gonzaga de Ica.

Redactando bien el problema que origina el proyecto:

- ***Limitado*** seguimiento de documentos en trámite en la sede del Ministerio Público de la Región Lambayeque.
- ***Ineficiente*** acceso a la información de precios de venta de productos de consumo masivo en los mercados de abastado de Lima Este por parte de amas de casa.
- ***Elevado*** número de quejas por errores en la consignación de conceptos de pago en recibos de facturación en la empresa Luz del Sur SAC.
- ***Deficiente*** registro y diifusion de la información del banco de Proyectos en la Fscultad fe Medicina de la Universidad San Hilarion.
- ***Deficiente*** elección de perfiles de los mejores candidatos en procesos de selección de personal de la Consulta PowerMind SRL.

Detallando el problema que origina el proyecto:

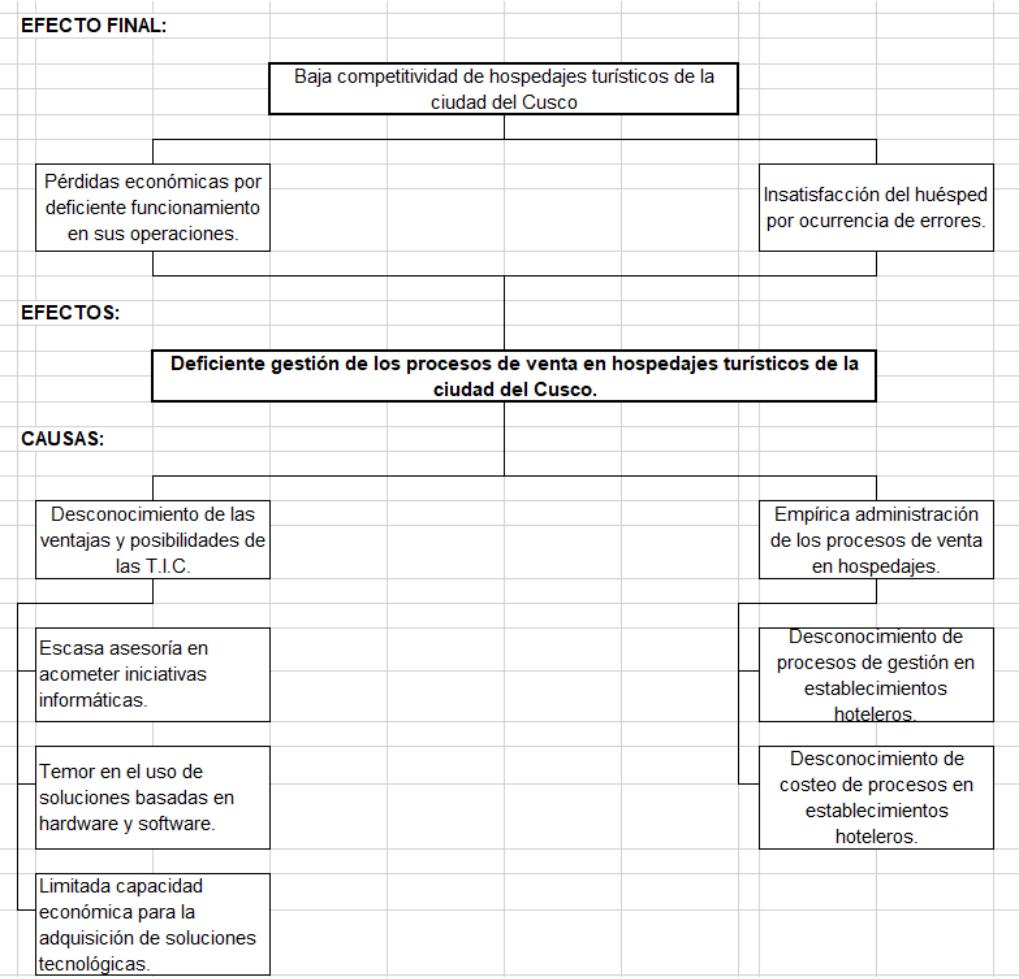

Redactando el problema que origina el proyecto:

1. Redacción del problema del proyecto:

Párrafos de introducción (esta línea es de orientación)

Según ley 30220, las universidades son centros de generación de conocimiento, de modo que responden a la sociedad con soluciones innovadoras [1]. Estos centros universitarios despliegan un conjunto de procesos con el fin de lograr profesionales que respondan a las necesidades de la sociedad, como lo menciona [2][3]. Qué duda cabe que al accionar dichos procesos y tener al ser humano como recurso principal, puedan generarse deficiencias ……..

Los procesos ayudan a las organizaciones a darle un sonido certero a sus propósitos [3], respecto de su misión y visión. Cabe destacar que los procesos universitarios ponen en relieve la ejecución de su cosmovisión basada de sus modelos curriculares [5]. Según el modelo de calidad del SINEACE [7] las universidades desarrollan procesos de enseñanza-aprendizaje, vinculación con el medio,

Roles dentro del equipo de proyecto:

Habilidades Directivas

Cuestionario sobre los roles de equipo
Basado en el Modelo de Meredith Belbin

Ver Semana 3 del aula virtual – Ubicar este recurso

Ciclo de vida de los proyectos:

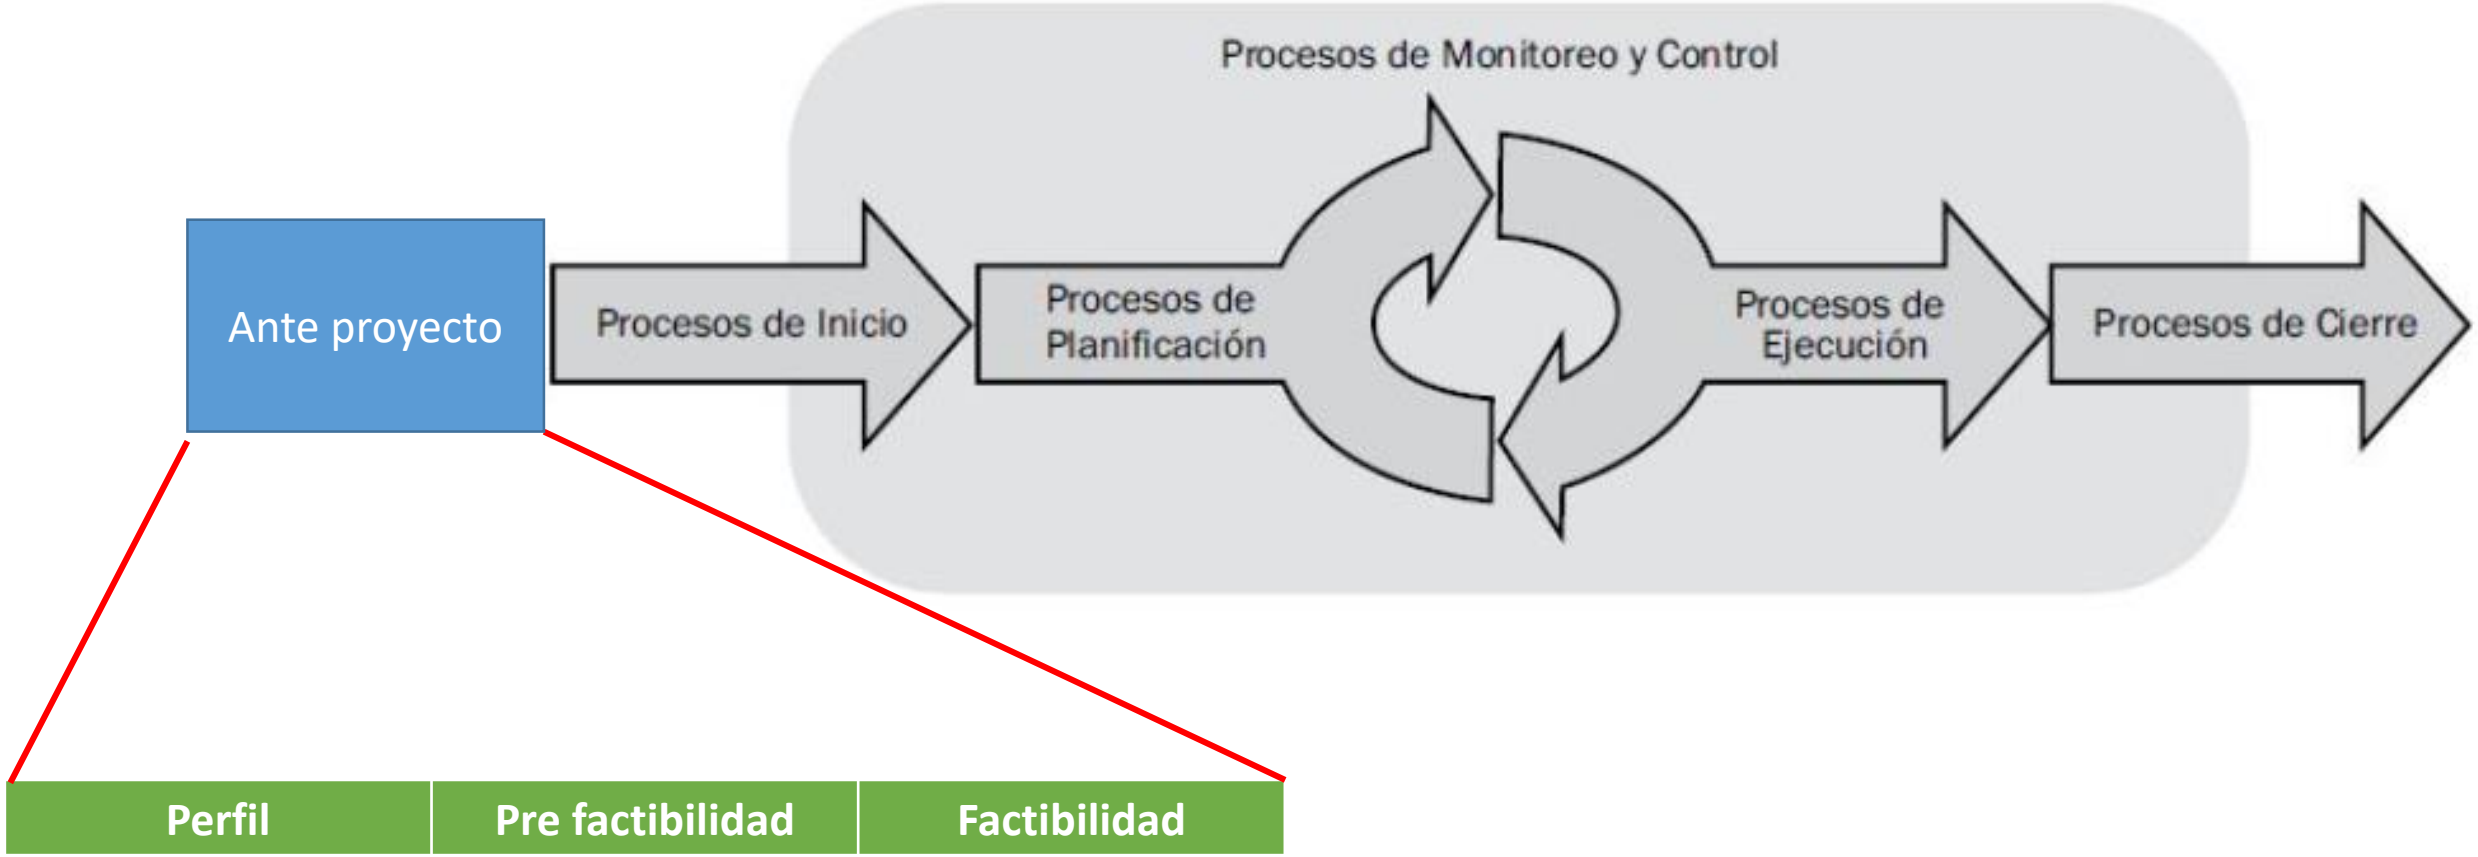

Grupo de procesos del PMOK

- **Grupo de Procesos de Inicio.** Procesos realizados para definir un nuevo proyecto o nueva fase de un proyecto existente al obtener la autorización para iniciar el proyecto o fase.
- **Grupo de Procesos de Planificación.** Procesos requeridos para establecer el alcance del proyecto, refinar los objetivos y definir el curso de acción requerido para alcanzar los objetivos propuestos del proyecto.
- **Grupo de Procesos de Ejecución.** Procesos realizados para completar el trabajo definido en el plan para la dirección del proyecto a fin de satisfacer los requisitos del proyecto.
- **Grupo de Procesos de Monitoreo y Control.** Procesos requeridos para hacer seguimiento, analizar y regular el progreso y el desempeño del proyecto, para identificar áreas en las que el plan requiera cambios y para iniciar los cambios correspondientes.
- **Grupo de Procesos de Cierre.** Procesos llevados a cabo para completar o cerrar formalmente el proyecto, fase o contrato.

Áreas de conocimiento:

1.2.4.6 ÁREAS DE CONOCIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS

Además de los Grupos de Procesos, los procesos también se categorizan por Áreas de Conocimiento. Un Área de Conocimiento es un área identificada de la dirección de proyectos definida por sus requisitos de conocimientos y que se describe en términos de los procesos, prácticas, entradas, salidas, herramientas y técnicas que la componen.

Si bien las Áreas de Conocimiento están interrelacionadas, se definen separadamente de la perspectiva de la dirección de proyectos. Las diez Áreas de Conocimiento identificadas en esta guía se utilizan en la mayoría de los proyectos, la mayoría de las veces. Las diez Áreas de Conocimiento descritas en esta guía son:

- **Gestión de la Integración del Proyecto.** Incluye los procesos y actividades para identificar, definir, combinar, unificar y coordinar los diversos procesos y actividades de dirección del proyecto dentro de los Grupos de Procesos de la Dirección de Proyectos.
- **Gestión del Alcance del Proyecto.** Incluye los procesos requeridos para garantizar que el proyecto incluye todo el trabajo requerido y únicamente el trabajo requerido para completarlo con éxito.

Ver: Guía del PMBOK. 6ta. Edición. Pág. 23

Correspondencia entre Grupos de procesos y Áreas de conocimiento en el PMBOK:

Tabla 1-4. Correspondencia entre Grupos de Procesos y Áreas de Conocimiento de la Dirección de Proyectos

Áreas de Conocimiento	Grupos de Procesos de la Dirección de Proyectos				
	Grupo de Procesos de Inicio	Grupo de Procesos de Planificación	Grupo de Procesos de Ejecución	Grupo de Procesos de Monitoreo y Control	Grupo de Procesos de Cierre
4. Gestión de la Integración del Proyecto	4.1 Desarrollar el Acta de Constitución del Proyecto	4.2 Desarrollar el Plan para la Dirección del Proyecto	4.3 Dirigir y Gestionar el Trabajo del Proyecto 4.4 Gestionar el Conocimiento del Proyecto	4.5 Monitorear y Controlar el Trabajo del Proyecto 4.6 Realizar el Control Integrado de Cambios	4.7 Cerrar el Proyecto o Fase
5. Gestión del Alcance del Proyecto		5.1 Planificar la Gestión del Alcance 5.2 Recopilar Requisitos 5.3 Definir el Alcance 5.4 Crear la EDT/WBS		5.5 Validar el Alcance 5.6 Controlar el Alcance	

Ver: Guía del PMBOK. 6ta. Edición. Pág. 23

Gracias!!!
